

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 19/2020

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Piha alue

- Piha-alueen tukimuurin loppu osa saatiin valettua viime viikolla. Parhaillaan aloittelemme piharakennuksen puurungon pystytystä. Maarakentaja aloittelee seuraavaksi muurin vierustäyttöjä.




Hallinto

- Hallinnon tiloissa tehtiin alkuvuikosta yläpölytarkastus, jonka jälkeen pääsimme ummistamaan alakattoja. Ensi viikolla aloittemme opinportaiden puuverhouksen asennusta.



Pääsisäänkäynti

- Pääsisäänkäynnin seinä- ja katto verhoukset ovat valmiit ja valaisimet asennettu. Eilen pinnoitimme tuulikaapin lattiaan.

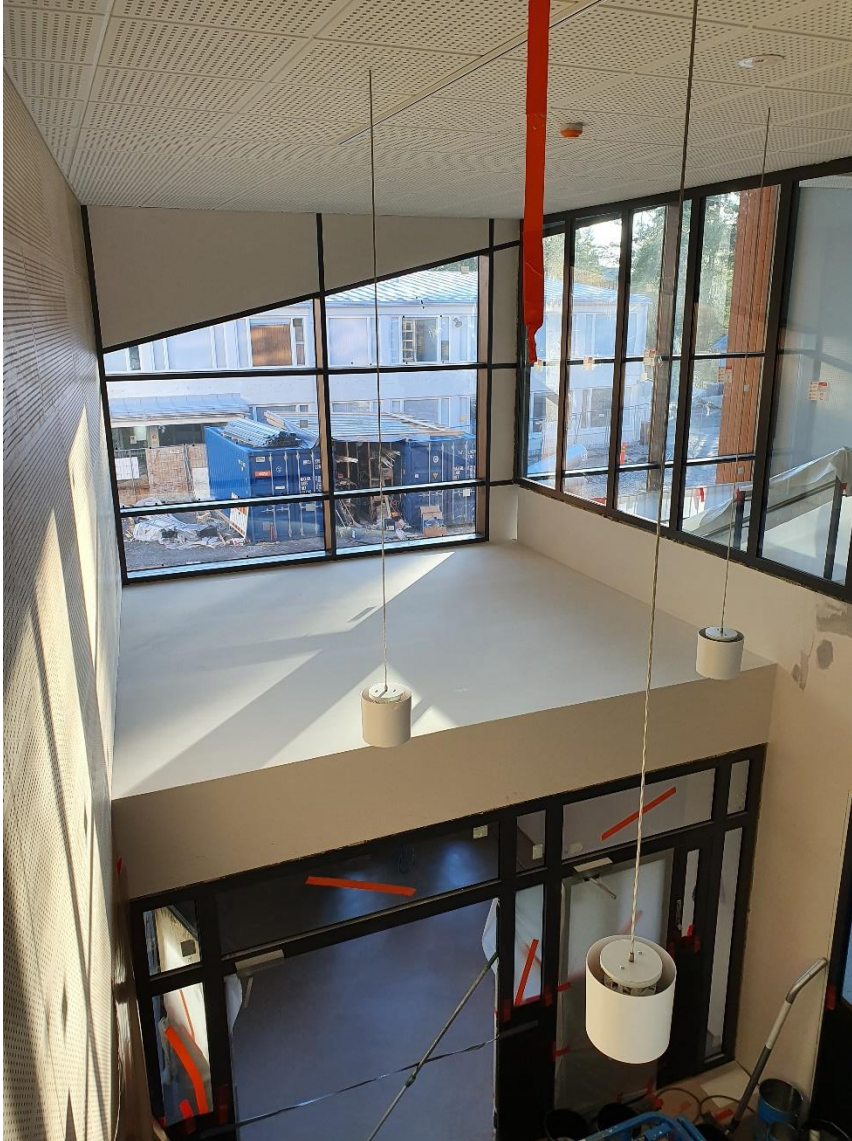

Ala- ja yläkoulu

- Loppusiivous on jo pitkällä ala- ja yläkoulun tiloissa. Ensi viikolla aloitamme ilmastoinnin säädön ja mittauksen.



Ensi viikon työvaiheita

- piha-alue: piharakennuksen puurunkotyöt
- 1 krs käytävät: yläpölysiivous ja alakattojen ummistus
- hallinto: ilmastoinnin päätelaitteiden asennus
- ala- ja yläkoulu: ilmastoinnin säätö ja mittaus

Muita huomioitavia asioita:

-



Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Terho Sysmälainen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411
