

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 22

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

- Viikko on kulunut vaihtelevassa säässä, mutta työt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Alkuvuikosta asensimme viimeiset pilari- ja sokkeli elementit lohkon 2 alueelle. Tänään työmaalle saapui ensimmäinen toimitus päiväkodin seinäelementtejä, joiden asennus alkaa heti ensi viikon maanantaina.
- Väestönsuojien muotti- ja rauditustöitä on tehnyt useampi työryhmä koko viikon ajan. Tavoitteemme on, että VSS1 saadaan valettua ensi viikon lopussa ja VSS2 viikon 26 loppu puolella.



- Sokkeliasennusten jälkeen maarakentaja on päässyt tekemään sisä- ja ulkopuolen täyttötöitä lohkon 1 ja 2 alueella. Maarakentajalla on kiire saada sisäpuolen täytöt tehtyä, ennen rungon elementti asennuksia, jotka alkavat jo ensi viikolla lohkon 3 osalta.




Ensi viikon työvaiheita:

- Väestönsuojan 1. seinä- ja holvimuottien teko, raudoitus sekä betonointi loppuviikosta.
- Väestönsuojan 2 nostojen betonointi, sisäpuolen täytöt ja lattiavalu.
- Lohkon 3 rungon elementti asennus.
- Loppujen sokkelielementtien juurivalut ja ulkopuolinen vesieristys.
- Sisä- ja ulkopuolen täyttötöet lohkon 1 ja 2 alueella.

Muita huomioitavia asioita:

- Ensi viikolla teemme muutoksia työmaa-aitaukseen alapuolisen kuvan mukaisesti. Vanhan koulu- ja varasto rakennuksen välissä on viemärin liittymäpiste, jonka luo joudumme louhimaan kanaalin. Logistisista syistä myös osa työmaaliikenteestä joudutaan ohjaamaan työmaalle kirkkotien kautta. Tämä järjestely on väliaikainen ja käytössä vain koululaisten kesäloman ajan.

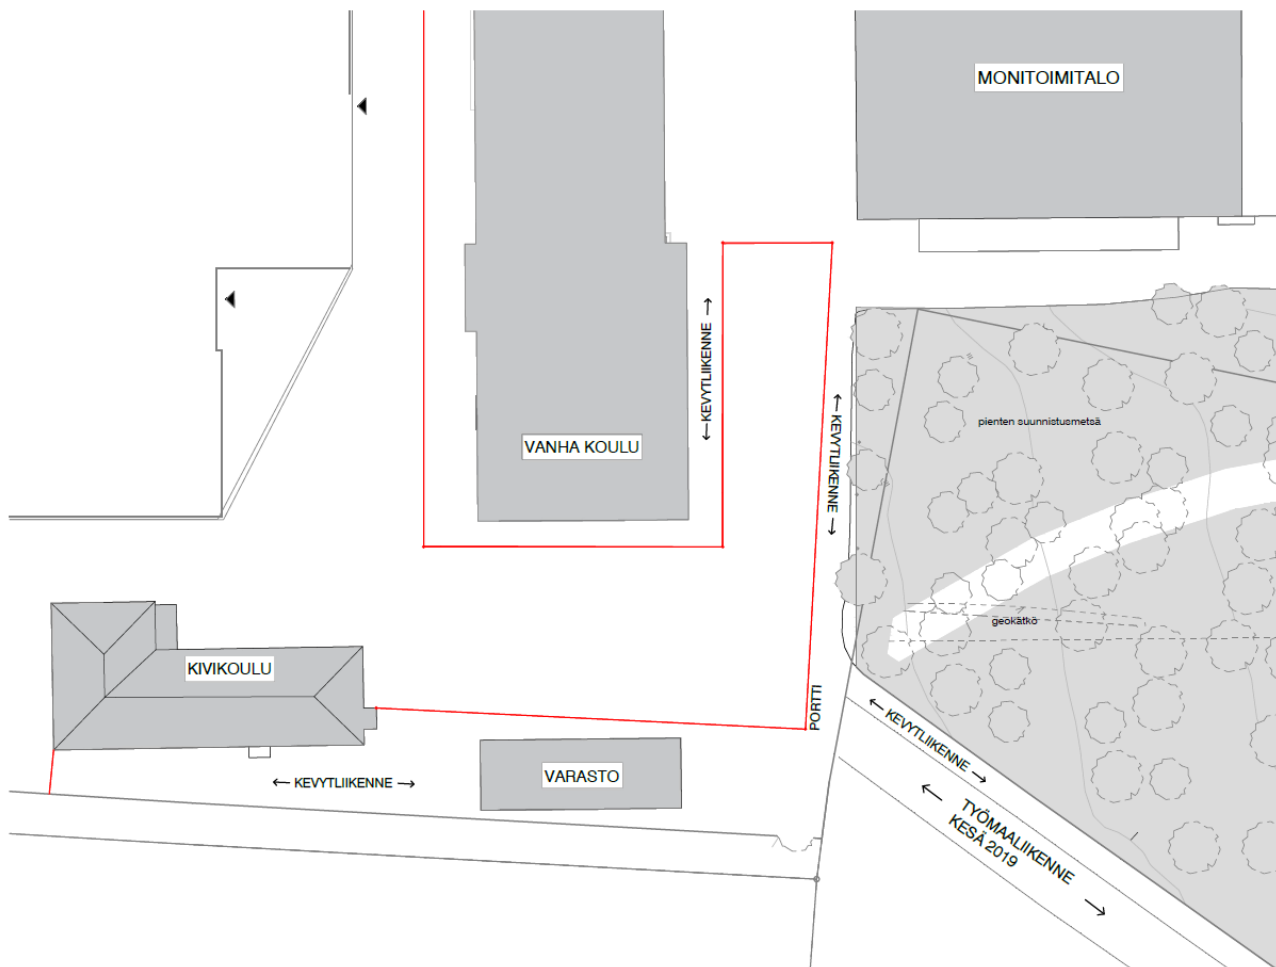

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy
Talonstrakentaminen Jyväskylä ja Mikkeli

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja
puh. 0407585680

Olli Lemettinen
työnjohtaja
puh. 0400356630

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
puh. 0503901411
