


# Viikkotiedote

## Hankasalmen koulukeskus vko 24

### Viikon merkittävimmät tapahtumat:

- Kuluneella viikolla asensimme päiväkodin yläpohjan ontelolaatat ja raudoitimme holvin. Ontelolaattojen juotosvalu tehdään tänään perjantaina. Ensi viikolla asennamme päiväkodin höyrinsulkukermin, jonka jälkeen alkaa IV-konehuoneen rungon asennustyöt.
- Keskiviikkona valoimme väestönsuojan ja loppu viikko on kulunut muotteja ja telineitä purkaessa. Työt ovat edenneet aikataulun mukaisesti ja mikä tärkeintä turvallisesti.

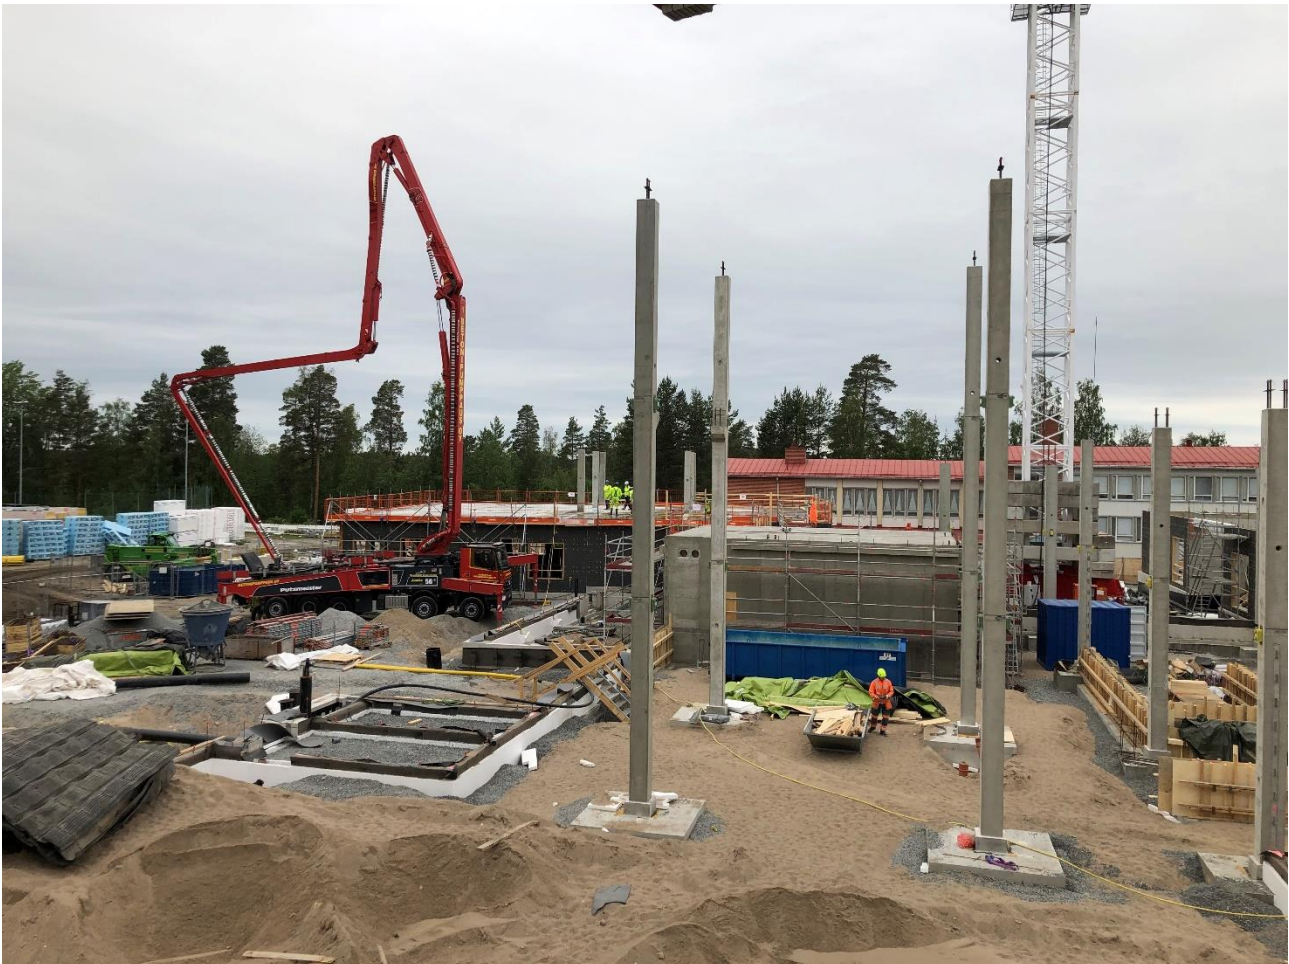

- Lohkon 2 rungon elementti asennus on edennyt myös suunnitelmien mukaisesti. Alkuvuikosta asensimme ulkoseinä- ja väliseinä elementtejä, puolivälissä viikkoa teräksisiä välipohjan palkkeja ja tänään työmaalle toimitetaan ensimmäiset kuormat välipohjan ontelolaattoja.
- Maarakentaja on jatkanut sisäpuolen täyttötöitä lohkon 1 alueella. Louhinta työryhmä on louhinut pihaluoteita ja putkikanaaleja.



### Ensi viikon työvaiheita

- Lohkon 2 välipohjan ontelolaattojen asennus ja holvin rauditus
- Lohkon 3 höyrynsulku kermin asennus
- Lohkon 3 IV-konehuoneen rungon asennus
- Väestönsuojan 2 muotti ja rauditustyöt
- Putkikanaalin louhinta viemärin liittymäpisteelle

### Muita huomioitavia asioita:

-



Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy  
Talonstrakentaminen Jyväskylä ja Mikkelii

Vesa Nieminen  
vastaava työnjohtaja  
puh. 0407585680

Olli Lemettinen  
työnjohtaja  
puh. 0400356630

Pertti Kirmanen  
työmaainsinööri  
puh. 0503901411
