

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 3/2020

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3: päiväkot

- Päiväkodilla alkavat luovutusvaiheen työvaiheet jo lähestyvä. Listoitustyöt ja putkikalustus valmistuvat vielä loppu viikon aikana. Ensi viikon jälkeen aloitamme yläpölysiivouksen, jonka jälkeen voimme ummistaa alakatot ja asentaa IV-päätelaitteet.



Lohko 2: ala- ja yläkoulu

- Alakoululla olemme pinnoittaneet lattiaita koko viikon ajan, jotta kiintokaluste asennukset pääsisivät käynnistymään ajallaan heti ensi viikon alussa. Hieman meinasi kiire tulla, mutta nyt lattiat ovat suojattu ja kalusteita kannetaan parhaillaan tiloihin. Ensi viikolla aloitamme myös puisten järjestelmä lasiseinien asennukset.




- Yläkoululla alakattorungot valmistuvat vielä viikonlopun aikana. Koko ensi viikko kuluu lattiapinnoitusten merkeissä.



Lohko 1: lukio ja hallinto

- Väestönsuojiiin sijoitettavien musiikkiluokan ja sosiaalitilojen painekokeet pidettiin kuluneella viikolla. Ensi viikolla aloitamme tekemään musiikkiluokan lattia- ja seinärakenteita. Aulassa teemme parhaillaan tuulikaapin sisäkattoa.

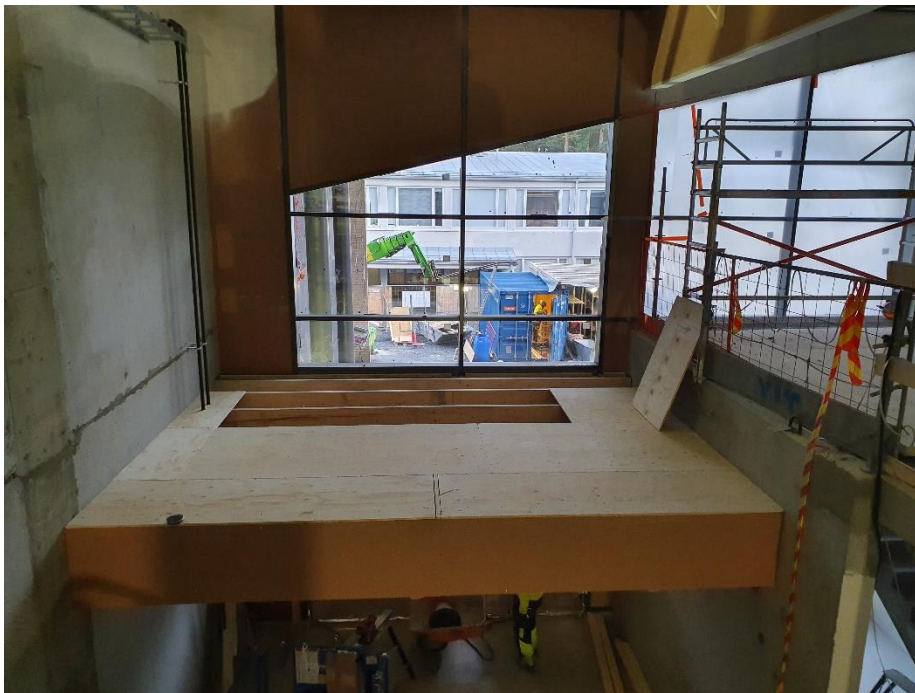

- Yläkerrassa hallinnon tiloissa laatoitustyöt alkavat olla lähes valmiit. Ensi viikolla aloitamme P1 siivouksen, jonka jälkeen IV-asennustyöt voivat alkaa. Lukiossa aloitamme LV-hajoitusten tekemisen ensi viikolla.



Ensi viikon työvaiheita

- lohko 3 viimeistelytyöt ennen yläpölysiivousta
- lohko 2, 1 krs kiintokaluste asennus
- lohko 2, 2 krs lattiapinnoitukset
- lohko 1, 1 krs musiikkiluokan db-rakenteet sekä aulan ja kohtaamon loput levyväliseinät
- lohko 1, 2 krs hallinnon P1 siivous ja IV-kanava asennukset

Muita huomioitavia asioita:

-



Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmäläinen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
pertti.kirmanen@yit.fi
puh. 0503901411
