

Viikkotiedote

Hankasalmen koulukeskus vko 41

Viikon merkittävimmät tapahtumat:

Lohko 3

- Alkuviikosta purimme torninosturin päiväkodin ja alakoulun välistä. Nyt pääsemmekin tekemään loput piha-alueen routaeristykset sekä täyttötyöt sisäpihalla. Päiväkodin sisällä on asennettu tällä viikolla sähkökaapeleita sekä siivottu P1 tarkastusta varten. Ensi viikolla aloitamme ilmastointikanavien asennuksen puhtaassa ja pölyttömässä ympäristössä.




Lohko 2

- Kuluneella viikolla aloitimme kevyiden levyväliseinien teon yläkoulun luokkatiloissa ja töiden odotetaan valmistuvan ensi viikolla. Heti seinien valmistuttua alkavat tasoitetyöt. Ensimmäisessä kerroksessa maalaustyöt ovat jo pitkällä. Julkisivumuurauksista lohkon kaksi osalta on tehty noin 2/3.



Lohko 1

- Kohtaamon portaan muottityöt on saatu aluille ja ensi viikolla pääsemme asentamaan raudoituksia. Väliseinien harkkomuuraukset alkavat olla loppusuoralla ja seuraavaksi aloittemme lämpölattioiden pohjatöitä 2-kerroksessa. Julkisivumuuraus etenee nyt kovalla vauhdilla, jotta työ saadaan tehtyä ennen talven tuloa.

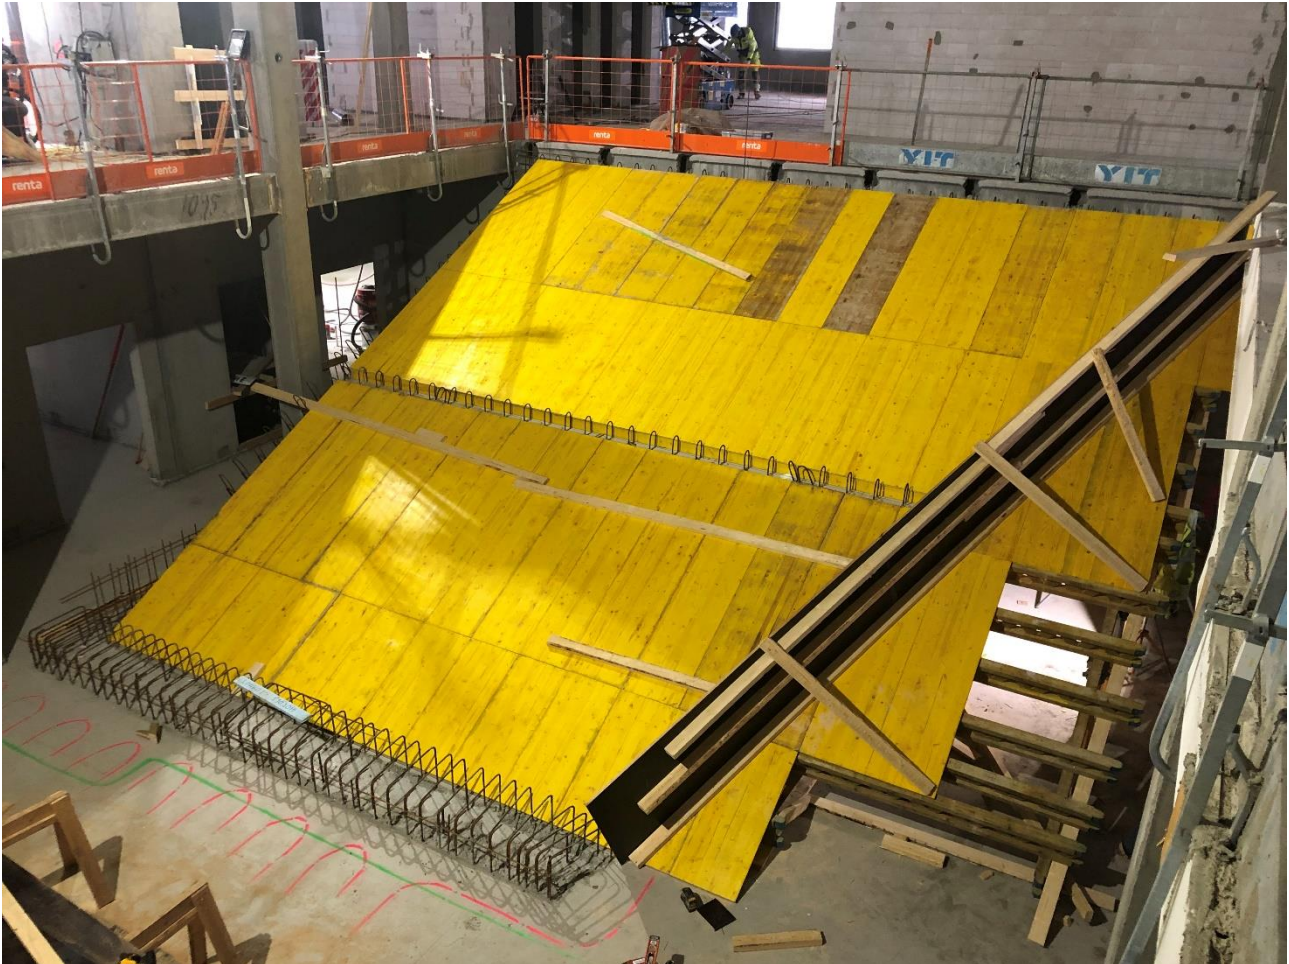

Ensi viikon työvaiheita

- Lonkon 3 ilmastointikanavien asennus
- Lohkon 2, 2krs levyväliseinät valmistuvat alkuviikosta
- Lohkon 2, 1krs maalaustyöt valmistuvat viikon aikana
- Lohkon 1, julkisivumuuraus etenee kovaa vauhtia
- Lohkon 1 kohtaamon portaan muotti ja raudoitustyöt

Muita huomioitavia asioita:

- Työmaalta toivotetaan koululaisille hyvää syysloma viikkoa!

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen
työnjohtaja

Terho Sysmälainen
työnjohtaja

Timo Järvinen
työnjohtaja

Pertti Kirmanen
työmaainsinööri
