

# Viikkotiedote

## Hankasalmen koulukeskus vko 7/2020

### Viikon merkittävimmät tapahtumat:

#### Lohko 3: päiväkot

- Päiväkodilla saatiin alakatot ummistettua ja ilmastoinnin päätelaitteiden asennus on kovaa vauhtia käynnissä. Alkuviikosta aloitimme myös sisäänkäyntien ulkoverhouspaneloinnit.




## Lohko 2: ala- ja yläkoulu

- Alakoululla alkavat seuraavaksi listoitustyöt ja töihin on varattu karkeasti koko ensi viikko. Tämän jälkeen pääsemme pyyhkimään yläpölyjä talotekniikan päältä ja ummistamaan alakatot.




- Yläkoululla sähkömiehet ovat tehneet kytkentöjä ryhmäkeskuksilla. Väliovien painikkeet ja helat asennettiin alkuvuokosta. Listoitustyöt alkavat heti kun työt saadaan alakoululla valmiiksi.

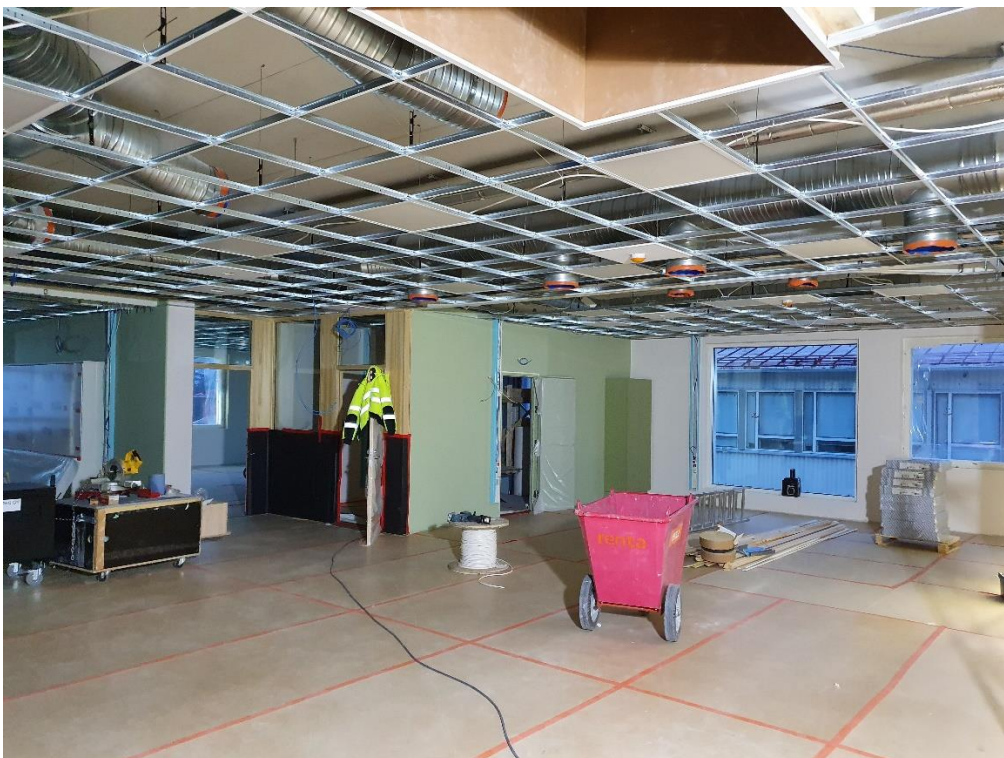


**Lohko 1: lukio ja hallinto**

- Lukion ja hallinnon tiloissa sähköurakoitsijamme on tehnyt kaapelointeja koko viikon ajan. Alakattotyöt etenevät sitä mukaa kun kaapeloinnit valmistuvat. Huomenna aloitamme lukiossa lattia pinnoitukset. Porrashuoneiden lattioiden mosaiikkibetonilaatta asennukset valmistuvat ensi viikon alussa.

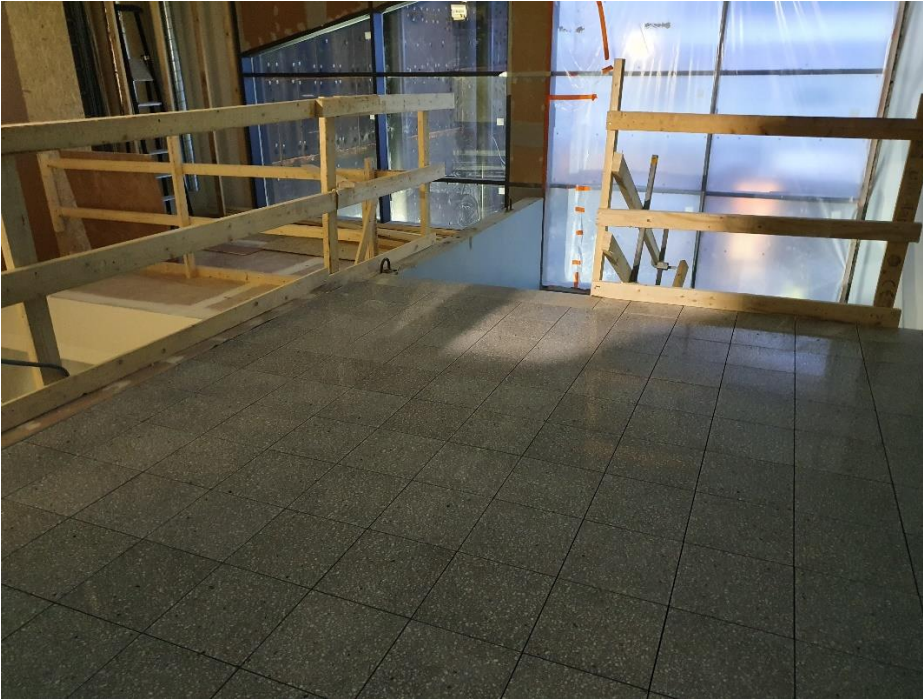

- Alakatto asentajat siirtyvät seuraavaksi hallinnon tiloihin.

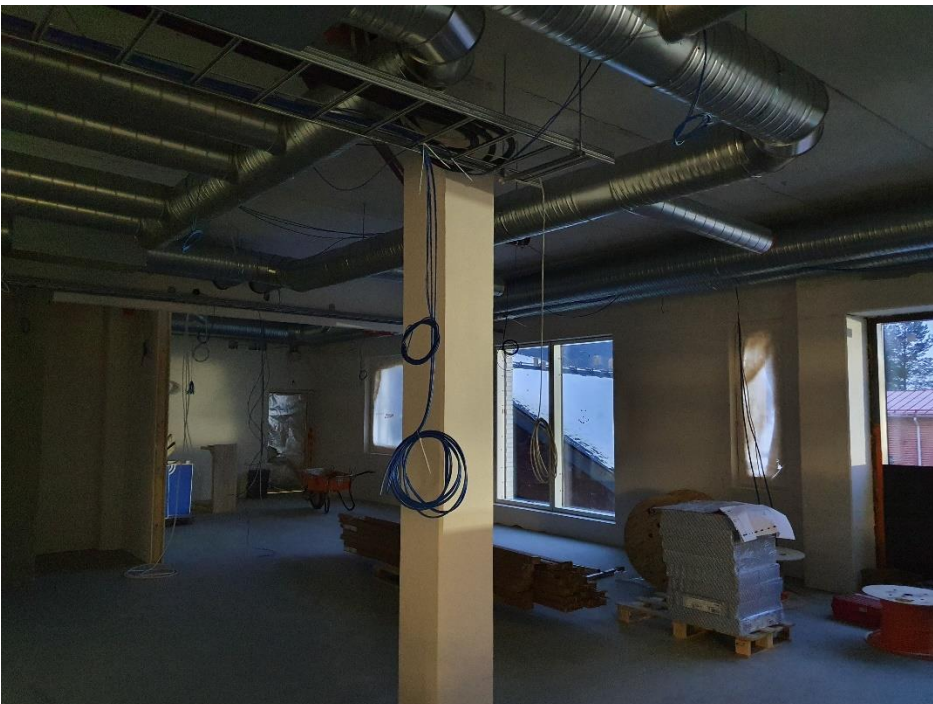

**Ensi viikon työvaiheita**

- lohko 3, loppusiivous
- lohko 2, alakoulu: listoitustyöt
- lohko 2, yläkoulu: varuste asennukset
- lohko 1, lukio lattiapinnoitukset
- lohko 1, hallinto: sähkökaapeloinnit sekä alakattorunkojen asennukset

**Muita huomioitavia asioita:**

-

Rakentavin terveisin:

YIT Suomi Oy

Vesa Nieminen  
vastaava työnjohtaja

Olli Lemettinen  
työnjohtaja

Terho Sysmälainen  
työnjohtaja

Timo Järvinen  
työnjohtaja

Pertti Kirmanen  
työmaainsinööri  
pertti.kirmanen@yit.fi  
puh. 0503901411
